

資料13 既存校舎等のアスベスト含有調査結果

■ 山形県立寒河江工業高等学校 平成30年度に実施した石綿含有調査における試料採取箇所

(「○」を付した部分が検体を採取した箇所)

建築年度	棟番号	外部仕上		内部仕上						
		外壁	軒裏	室名	床	巾木	壁	天井	その他	
38	2-2	1 ダイヤセム ダイヤアルテックス3000#	○ 99 木毛セメント板打上 ダイヤセム刷毛引き	多目的室	ブナフローリング		四分一	モルタルVP プaster、一部板張り	3 PB	○ 黒板、掲示板、煙突
				美術教室	ブナフローリング		四分一	モルタルVP プaster、一部板張り	PB	黒板、掲示板、煙突、FF
				廊下	ブナフローリング		四分一	モルタルVP プaster	PB	
				階段室	2 Pタイル	○		モルタルVP プaster	PB	
38	5-4	ダイヤセム ダイヤアルテックス3000#	木毛セメント板打上 ダイヤセム刷毛引き	機械加工実習室	カラークリート		モルタル	モルタルVP	4 ジブトーン	○ 黒板、煙突、FF
				工具室	土間コンクリート		モルタル	モルタル ラワンベニヤ	PB	
38	7-1	5 ダイヤセム ダイヤアルテックス3000#	○ 木毛セメント板打上 ダイヤセム刷毛引き	倉庫	モルタル		モルタル	モルタル	9 木毛セメント板	○ 棚
				女子更衣室	Pタイル		ソフト巾木	PBクロス	ジブトーン	後年度改修
				印刷室	Pタイル		ソフト巾木	PBクロス	ジブトーン	後年度改修
				書庫	6 Pタイル	○	7 ソフト巾木	○ 8 PBクロス	○ 10 ジブトーン	○ 後年度改修
				廊下	Pタイル		ソフト巾木	PBクロス	ジブトーン	後年度改修
39	1-2	11 ダイヤセム ダイヤアルテックス3000#	○ 12 木毛セメント板	CR	ブナフローリング		四分一	モルタルVP プaster、一部板張り	14 PB	○ 黒板、掲示板、煙突、FF
				保健室	ブナフローリング		四分一	モルタルVP プaster、一部板張り	PB	黒板、掲示板、煙突、流し、FF、AC
				売店・物置	土間コンクリート			モルタル	15 耐火ボード	○ 流し、棚
				技能員室	板敷き		四分一	クロス	ジブトーン	FF、AC
				カウンタリング室	たたみ ブナフローリング		たたみ寄せ	モルタルVP プaster、クロス	耐火ボード	煙突、棚、FF
				階段室	13 Pタイル	○		モルタルVP プaster	PB	
	渡り廊下	ブナフローリング			モルタルVP	耐火ボード				
9										
39	2-1	ダイヤセム ダイヤアルテックス3000#	木毛セメント板打上 ダイヤセム刷毛引き	CR	ブナフローリング		四分一	モルタルVP プaster、一部板張り	17 PB	○ 黒板、掲示板、煙突、FF
				廊下	ブナフローリング		四分一	モルタルVP プaster	PB	研ぎだし流し
				階段室	16 アスタイル	○		モルタルVP プaster	PB	
39	4-4	18 ダイヤセム ダイヤアルテックス3000#	○ 木毛セメント板打上 ダイヤセム刷毛引き	CAD実習室	ブナフローリング		モルタル	プaster	19 耐火ボード	○ 黒板、煙突、掲示板、流し、棚、FF
				生徒会室	ブナフローリング		モルタル	プaster	耐火ボード	黒板、煙突、掲示板、FF
				廊下	ブナフローリング		モルタル	プaster	耐火ボード	
39	5-5	ダイヤセム ダイヤアルテックス3000#	20 木毛セメント板打上 一部ボードで補修 ダイヤセム刷毛引き	仕上組立実習室	カラークリート		モルタル	モルタルVP	21 ジブトーン	○ 黒板、煙突、掲示板、FF
				メカトロ実習室1	OAフロア タイルカーベット		モルタル	モルタルVP	ジブトーン	ホワイトボード、煙突、FF
39	6	モルタル		受変電機室	土間コンクリート		モルタル	モルタル		
				玄関	現場打ちテラゾー		テラゾー貼	テラゾー貼	26 吸音テックス	○ 校内案内板
				ホール	ブナフローリング		モルタルゾラコート	モルタルゾラコート	吸音テックス	
				物置	ブナフローリング		四分一	モルタルVP プaster	PB	
				視聴覚準備室	フローリング		四分一	プaster 25 京葉漆	○ 杉貼	押入
				物置	ブナフローリング		四分一	モルタルVP プaster	PB	
				事務室	ブナフローリング		四分一	モルタルVP プaster	27 ジブトーン	○ 煙突(石綿スレートパイプ打込み、以下共通)、カウンタ、流し、棚、FF、AC
				校長室	24 塩ビシート	○	四分一	モルタルビニールクロス	ジブトーン	黒板、煙突、流し、棚、FF、AC

■ 山形県立寒河江工業高等学校 平成30年度に実施した石綿含有調査における試料採取箇所

(「○」を付した部分が検体を採取した箇所)

建築 年度	棟番号	外部仕上		内部仕上												
		外壁	軒裏	室名	床	巾木	壁	天井	その他							
40	1-1	22 ダイヤセム ダイヤモンドテックス3000#	○	23 木毛セメント板	○	進路指導室	28 Pタイル	○	四分一	モルタルVP プリント合板	ジブトーン	黒板、煙突、棚、FF、AC				
						生徒閲覧室	ブナフローリング		四分一	モルタルVP プラスター	PB	流し				
						放送室	ブナフローリング		四分一	モルタル布クロス プラスター布クロス	吸音テックス	黒板、ホワイトボード				
						職員室	ブナフローリング		四分一	モルタルVP プラスター	ジブトーン	黒板、煙突、流し、棚、FF、AC				
						会議室	ブナフローリング		四分一	モルタルVP プリント合板	PB	黒板、煙突、FF、AC				
						小会議室	ブナフローリング		四分一	モルタルVP プラスター	PB	黒板、掲示板、FF、AC				
						面談室	ブナフローリング		四分一	モルタルVP プラスター、一部板張り	PB	黒板、掲示板、煙突、FF				
						CR	ブナフローリング		四分一	モルタルVP プラスター、一部板張り	PB	黒板、掲示板、煙突、FF				
						多目的室	ブナフローリング		四分一	モルタルVP プラスター、一部板張り	PB	黒板、掲示板、煙突、FF				
						廊下	ブナフローリング		四分一	モルタルVP プラスター	30 PB	○ 研ぎだし流し				
	1-3	階段室	Pタイル				モルタルVP プラスター	PB								
										視聴覚教室	ブナフローリング		四分一	モルタルVP プラスター	吸音テックス	ホワイトボード、ボンエルト貼掲示板、棚、FF 煙突
	3-4	音楽教室	ブナフローリング				モルタルVP、一部ボード貼 プラスター	吸音テックス	黒板、パイロン貼掲示板、煙突、FF							
										物理実験室	ブナフローリング		四分一	モルタルVP プラスター	PB	黒板、布地ランヤ貼掲示板、煙突、流し、棚、FF
	8	理科準備室	29 長尺塩ビシート	○	四分一	モルタルVP プラスター	PB	煙突、流し、棚、AC ドラフト(石綿スレートパイプ)								
									化学実験室	長尺塩ビシート		四分一	モルタルVP プラスター	PB	黒板、掲示板、煙突、流し、棚	
	11	廊下	ブナフローリング				モルタルVP プラスター	PB								
										渡り廊下	ブナフローリング		四分一	モルタルVP	耐火ボード	
	13	新聞雑誌コーナー	ブナフローリング				モルタルグラコト プラスター、プリント合板	PB	煙突、流し、FF							
										事務室 教員閲覧室	ブナフローリング		四分一	モルタルグラコト プラスター、プリント合板	PB	煙突、流し、棚、FF
14	閲覧室	ブナフローリング				モルタルグラコト プラスター、プリント合板	ジブトーン	煙突、棚、FF、AC								
									WC	31 アスタイル モザイクタイル	○	人研 モザイクタイル	着色モルタル	臭突(石綿スレートパイプ)		
15	木毛セメント板	32 大平板	○	昇降口	土間コンクリート ブナフローリング	モルタルVP	PB									
									木毛セメント板	渡り廊下	ブナフローリング		モルタルVP	33 耐火ボード	○	
40	3-3	ダイヤセム ダイヤモンドテックス3000#	○	木毛セメント板打上 ダイヤセム刷毛引き		休憩室	ブナフローリング		四分一	モルタルVP プラスター	35 ジブトーン	○ 黒板、煙突、掲示板、流し、棚、AC				
						制御実習室	ブナフローリング		四分一	モルタルVP プラスター	36 PB	○ 黒板、煙突、掲示板				
						廊下	ブナフローリング		四分一	モルタルVP プラスター	PB					
	4-3	階段室	34 アスタイル	○			モルタルVP プラスター	PB								
										工作実習室(2)	ブナフローリング		四分一	モルタルVP プラスター	PB	煙突、流し、FF
										電子機械科職員室	ブナフローリング		四分一	モルタルVP プラスター	PB	ホワイトボード、煙突、掲示板、流し、FF、AC
										廊下	ブナフローリング		四分一	モルタルVP プラスター	PB	
階段室	37 Pタイル	○				モルタルVP プラスター	PB									
工業計測実習室	長尺塩ビシート					モルタルVP プラスター	PB	黒板、掲示板、棚、FF								

■ 山形県立寒河江工業高等学校 平成30年度に実施した石綿含有調査における試料採取箇所

(「○」を付した部分が検体を採取した箇所)

建築 年度	棟番号	外部仕上		内部仕上													
		外壁	軒裏	室名	床	巾木	壁	天井	その他								
40	5-3	38 ダイヤセム ダイヤアルテックス3000#	○	39 木毛セメント板打上 ダイヤセム刷毛引き	○	MC準備室	ブナフローリング	四分一	モルタルVP プaster	40 ジブトーン	○ 黒板、煙突、掲示板、流し、棚、FF						
						MC実習室	カラークリート	モルタル	モルタルVP プaster	PB	黒板、流し、棚						
	廊下					モルタル ブナフローリング	四分一	モルタルVP プaster	PB								
	鋳造実習室					モルタル 土間	モルタル	モルタル プaster	41 木毛セメント板	○ 黒板、キューボラ、煙突							
5-6	19	100 ダイヤセム ダイヤアルテックス3000#	○	メカトロ実習室2	カラークリート	モルタル	モルタル プaster	ジブトーン	ホワイトボード、煙突、掲示板、FF								
20				便所	モザイクタイル	モザイクタイル	モザイクタイル 着色プaster	着色セメント吹付									
41	3-1	42 ダイヤセム ダイヤアルテックス3000#	○	43 木毛セメント板打上 ダイヤセム刷毛引き	○	応用力学実習室	土間コンクリート	モルタル幅木	モルタルVP プaster	44 PB	○ 黒板、煙突、掲示板						
						アスファルト実習室	土間コンクリート	モルタル幅木	モルタルVP ラスボード下地プaster	PB	黒板						
						ロサンゼルス試験室	土間コンクリート	モルタル幅木	モルタルVP トリゾールブロック表し	トリゾールブロック表し							
						器材置場	土間コンクリート	モルタル幅木	モルタルVP ラスボード下地プaster	PB							
						セメント倉庫	土間コンクリート	モルタル幅木	モルタルVP	PB							
						精密測定室	土間コンクリート	モルタル幅木	モルタルVP ラスボード下地プaster	PB							
						41	3-2	ダイヤセム ダイヤアルテックス3000#	○	木毛セメント板打上 ダイヤセム刷毛引き	○	土質試験実習室	土間コンクリート		モルタルVP プaster	PB	黒板、煙突
						制御実習室	土間コンクリート		モルタルVP プaster	PB	ホワイトボード、						
						製図室	ブナフローリング	四分一	モルタルVP プaster	45 吸音テックス	○ 黒板、煙突、掲示板、FF						
41	4-1	ダイヤセム ダイヤアルテックス3000#	○	木毛セメント板打上 ダイヤセム刷毛引き	○	画像処理実習室	フローリング	四分一	モルタルVP プaster	PB	黒板、煙突、掲示板、棚、FF						
						通信システム実習室	フローリング	四分一	モルタルVP プaster	PB	黒板、煙突、掲示板、棚、FF						
						倉庫	フローリング	四分一	モルタルVP	48 木毛セメント板	○						
						暗室	フローリング	四分一	モルタルVP ラスボード下地プaster	PB							
						2階倉庫	モルタル	四分一	モルタルVP	PB							
						基礎計測実習室	フローリング	四分一	モルタルVP	吸音テックス	黒板、煙突、掲示板、流し、FF						
												階段室	47 Pタイル	○	モルタルVP プaster	PB	
41	4-2	ダイヤセム ダイヤアルテックス3000#	○	木毛セメント板打上 ダイヤセム刷毛引き	○	工作準備室	ブナフローリング	モルタル	モルタルVP プaster	48 PB	○ 黒板、煙突、棚						
						工作実習室(1)	ブナフローリング	モルタル	モルタルVP プaster	PB	黒板、煙突、FF						
						工業基礎実習室	ブナフローリング	四分一	モルタルVP プaster	PB	黒板、煙突、掲示板、流し、FF						
						総合学習指導室	ブナフローリング	四分一	モルタルVP プaster	PB							
						廊下	ブナフローリング	モルタル	モルタルVP プaster	PB							
						18						渡り廊下	ブナフローリング	モルタル	モルタルVP プaster	PB	
						41	5-1, 5-2	49 ダイヤセム ダイヤアルテックス3000#	○	木毛セメント板打上 ダイヤセム刷毛引き	○	NC旋盤実習室	塗床	ソフト巾木	モルタルVP	50 ジブトーン	○ 黒板、煙突、掲示板
暗室	モルタル	木製	モルタルVP	プaster													
倉庫	モルタル	木製	モルタル	プaster													
製図室	ブナフローリング	木製	モルタルVP	PB	黒板、煙突、掲示板、FF												

■ 山形県立寒河江工業高等学校 平成30年度に実施した石綿含有調査における試料採取箇所

(「○」を付した部分が検体を採取した箇所)

建築年度	棟番号	外部仕上		内部仕上							
		外壁	軒裏	室名	床	巾木	壁	天井	その他		
				廊下	ブナフローリング	木製	モルタルVP	PB			
				階段室	51 Pタイル	○	モルタルVP	PB	研ぎだし流し		
41	16	52 ネオエース吹付	○ 53 大平板EP	○ 渡り廊下	ブナフローリング	木製	モルタル	54 タイガーボード	○		
	17	ネオエース吹付 55 クニテックス吹付	○ ネオエース吹付	体育室	ブナフローリング	木製	ラワン羽目板	トリゾール板エルジンカ吹付		屋根 トリゾール板下地	
				ステージ	ブナフローリング	モルタル 木製	モルタルVP モルタルクニテックス	トリゾール板エルジンカ吹付			
				器具室	ブナフローリング	木製	モルタルVP	プラスター 木毛セメント板エルジンカ吹付			
				物入	ブナフローリング	木製	モルタル ベニヤ	プラスター 木毛セメント板エルジンカ吹付			
				更衣室	ブナフローリング	木製	モルタルVP	プラスター 木毛セメント板エルジンカ吹付			
				放送室	ブナフローリング	木製	56 テックス下地有孔ベニヤ	○ テックス下地有孔ベニヤ			
				地下物置	モルタル	防水モルタル	防水モルタル ラワン	防水モルタル ラワン			
				管理室	クリスター塗	モルタル 木製	モルタルVP ラワンOP	トリゾール板エルジンカ吹付		AC、FF	
				トレーニングルーム	クリスター塗	モルタル 木製	モルタルVP ラワンOP	トリゾール板エルジンカ吹付			
				2階物置	モルタル	モルタル 木製	モルタルVP ラワンOP	57 トリゾール板エルジンカ吹付	○		
				ギャラリー	クリスター塗	木製	ラワン羽目板	トリゾール板エルジンカ吹付			
				ロッカー室	ブナフローリング	モルタル 木製	モルタル ラワンベニヤ	モルタル			
43	5-7	58 ダイヤセム ダイヤアルテックス3000#	○ 大平板打上 ダイヤセム吹付け	原動機実習室	モルタル	モルタル	モルタル シナベニヤ	59 木毛セメント板	○ 黒板、煙突、流し、棚		
				準備室	モルタル	モルタル	モルタル シナベニヤ	60 PB	○ 黒板		
46	5-8	ダイヤセム ダイヤアルテックス3000#	大平板打上 ダイヤセム吹付け	物置	モルタル		モルタル ベニヤ	PB	黒板、掲示板		
46	23	61 ダイヤリシン吹付	○ 101 ダイヤリシン吹付	○ 部室	化粧フロア		モルタルVP プリント合板	PB			
				○ 廊下	化粧フロア		モルタルVP プリント合板	63 PB	○		
				シャワー室	モルタル		モルタルVP	大平板		隔壁:大平板	
				玄関	モルタル		モルタルVP	PB			
46	24	ダイヤリシン吹付	62 大平板VP	○ 柔剣道場	化粧フロア	木製	ラワン羽目板 有孔ラワンベニヤ	64 トリゾール板WP吹付	○		
				用具室	化粧フロア	木製	モルタルVP	PB			
47	25		65 ボード	○ 機械科倉庫							
50	30	66 ダイヤリシン吹付	○ 木部あらわし	器具室	モルタル	モルタル	ラワンベニヤ	PB			
				女子更衣室	モルタル	モルタル	ラワンベニヤ	PB			
				男子更衣室	モルタル	モルタル	ラワンベニヤ	PB			
				機械室	モルタル	モルタル	ラワンベニヤ	67 PB	○		
				便所	モザイクタイル	モザイクタイル	ポリ合板	PB			
	32		折板あらわし	渡り廊下	カラートップ	カラートップ	CB積	フレキシブルボード			
				回路設計実習室	68 OAFロア Pタイル	○ 70 ソフト巾木	○	モルタルVP 71 PBVP	○	ジブトーン	黒板、煙突、掲示板、流し、FF
				情報処理実習室 (1)	OAFロア Pタイル	ソフト巾木		モルタルVP		ジブトーン	ホワイトボード、煙突、掲示板、流し、FF

■ 山形県立寒河江工業高等学校 平成30年度に実施した石綿含有調査における試料採取箇所

(「○」を付した部分が検体を採取した箇所)

建築年度	棟番号	外部仕上		内部仕上											
		外壁	軒裏	室名	床	巾木	壁	天井	その他						
51	33	68 アクリルリシン	○	なし	便所	モザイクタイル	タイル	タイル	72 ダンコートP	○					
					情報科管理室	フローリングブロック	ソフト巾木	モルタルVP	ジブトーン		黒板、煙突、掲示板				
					情報処理実習室(2)	OAフロアPタイル	ソフト巾木	モルタルVP	ジブトーン		ホワイトボード、煙突、掲示板、流し、FF、AC、スクリーン				
					情報技術科管理室	73 フリーアクセスフロアPタイル	○ソフト巾木	有孔74 フレキシブルボードGW入り	○ジブトーン		ホワイトボード、掲示板、FF、AC				
					廊下	Pタイル	ソフト巾木	モルタルVP	76 ジブトーン	○					
				階段室	75 Pタイル	○ソフト巾木	モルタルVP	ジブトーン		段裏リシン吹付					
52	34	77 アクリルリシン	○	102 アクリルリシン	○	渡り廊下	カラークリート	モルタルEP	モルタルEP	ジブトーン					
	35				○	施工機械実習室	モルタル、土間	モルタルEP	モルタルEP	木毛セメント板EP		黒板、煙突、掲示板			
					○	施工実習室	フローリングブロック	モルタルEP	モルタルEP	ジブトーン		黒板、煙突、掲示板、棚、FF			
					○	水理試験実験室	カラークリート	モルタルEP	モルタルEP	79 木毛セメント板EP	○	煙突、掲示板			
				廊下	80 Pタイルカラークリート	○モルタルEP	モルタルEP	81 ジブトーン	○						
	36			フレキシブルボードEP	渡り廊下	Pタイル	モルタルEP	モルタルEP リシン(3-1, 2外壁)	ジブトーン						
57	37				WC	モザイクタイル		タイル	84 ジブトーン	○					
57	38	82 複層模様吹付け	○	複層模様吹付け	溶接実習室	カラークリート	モルタルEP	モルタルEP	85 木毛マグネシウム板EP	○	黒板、煙突、掲示板				
					試験計測実習室	カラークリート	モルタルEP	モルタルEP	木毛マグネシウム板EP		黒板、煙突、掲示板、流し、棚、FF				
					暗室	カラークリート	モルタルEP	モルタルEP	石綿ケイカル板EP		棚				
					便所	モザイクタイル		タイル モルタルEP	モルタルEP 石綿ケイカル板EP						
					管理室	バケットフロア		モルタルEP	化粧PB		黒板、煙突、掲示板、流し、棚、FF、AC				
					工業基礎実習室(1)	フローリングブロック	モルタルEP	モルタルEP	化粧PB		黒板、煙突、掲示板、FF				
					工業基礎実習室(2)	フローリングブロック	モルタルEP	モルタルEP	化粧PB		黒板、煙突、掲示板、FF				
					廊下	83 長尺塩ビシート	○モルタルEP	モルタルEP	86 化粧PB	○					
					階段室	長尺塩ビシート	モルタルEP	モルタルEP	化粧PB		掲示板				
		39	87 吹付けタイル	○	88 フレキシブルボードEP	○	渡り廊下	長尺塩ビシート	モルタルEP	化粧PB					
62	42	鉄板系サイディング		89 ボード	○	○	90 ボード	○	91 ボード	○					
4	45				女子WC	モザイクタイル		タイル、92 リシン吹付け	○	93 ボード貼り	○				
5	46	94 複層模様吹付け	○	複層模様吹付け	廊下	長尺塩ビシート	ソフト巾木	モルタルEP	吸音PB						
					食物準備室	95長尺塩ビシート	○	96 ソフト巾木	○	97 PBEP	○	98 吸音PB	○	掲示板	
					食物実習室	長尺塩ビシート	ソフト巾木	PBEP	吸音PB		掲示板、スクリーン、棚、FF				
					被服準備室	フローリングブロック	ソフト巾木	PBEP	吸音PB		流し、棚、FF				
					被服実習室	フローリングブロック	ソフト巾木	PBEP	吸音PB		ホワイトボード、掲示板、スクリーン、流し、棚、FF				
検体採取箇所 計 (単位:箇所)			18		16		18		3		8		39	総合計	102

(注) 仕上げの状況については、図面を基に作成したものであるが、現況とは異なる箇所がある。

【検体抽出等の考え方】

- ・同一年竣工箇所ではアスベストの含有が疑われる箇所から、最低1検体、使用箇所の多いものは2検体を抽出する。
- ・同一年竣工でも、後年度改修されたと思われる箇所は当初施工箇所とは別に1検体を抽出する。
- ・工事の発注単位は、建築年度欄の区分のとおりである。
- ・赤字の材料について、調査対象検体とする。

平成30年度


(B4)


施設の配置図



学校名	東市立高等学校
調査番号	06
(都道府県)	
(市町村)	
(学校)	5522
整理番号	

- 凡例
- 建物
- ㊦ 未とりこなし建物
 - ㊧ 危険建物
 - ㊨ 借用建物
 - ㊩ 一時使用建物
- 建物以外の工作物
- ㊰ 自転車置場
 - ㊱ 倉庫
 - ㊲ 吹き抜けの渡廊下
 - ㊳ 温室
 - ㊴ 相撲場
 - ㊵ 簡易の規模
 - ㊶ 陸球フェンス
 - ㊷ 掲揚ポール
 - ㊸ ポンプ室
 - ㊹ 水塔上屋
 - ㊺ 砂利置場

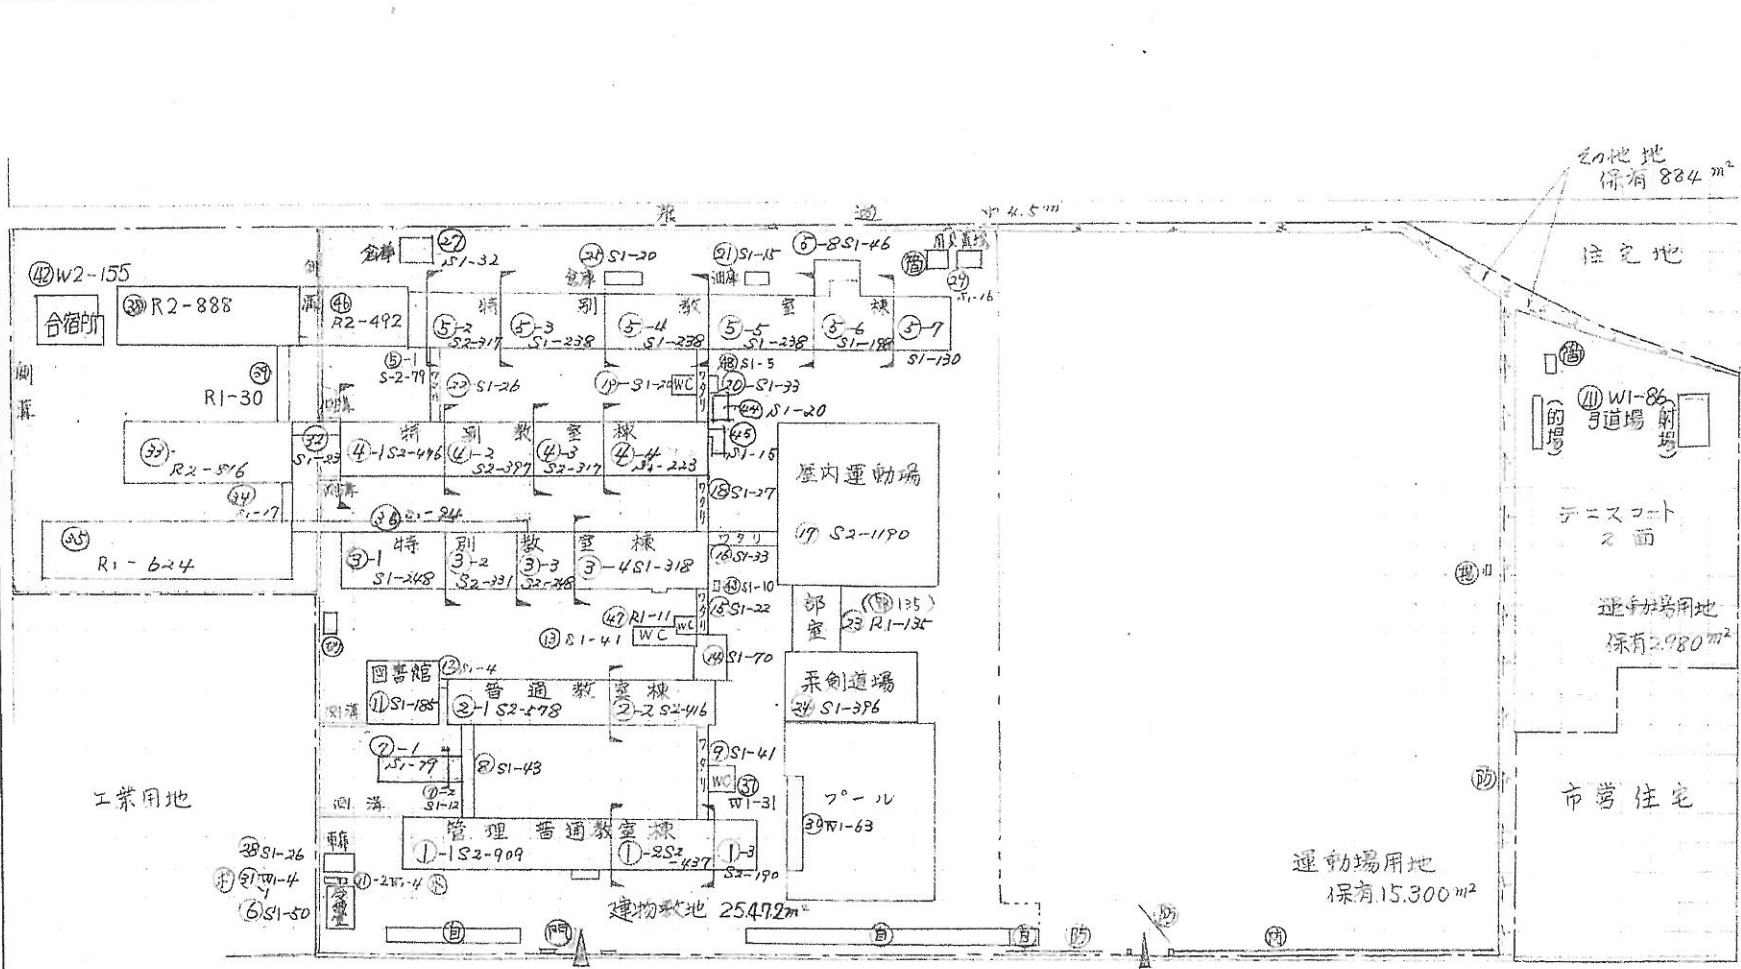

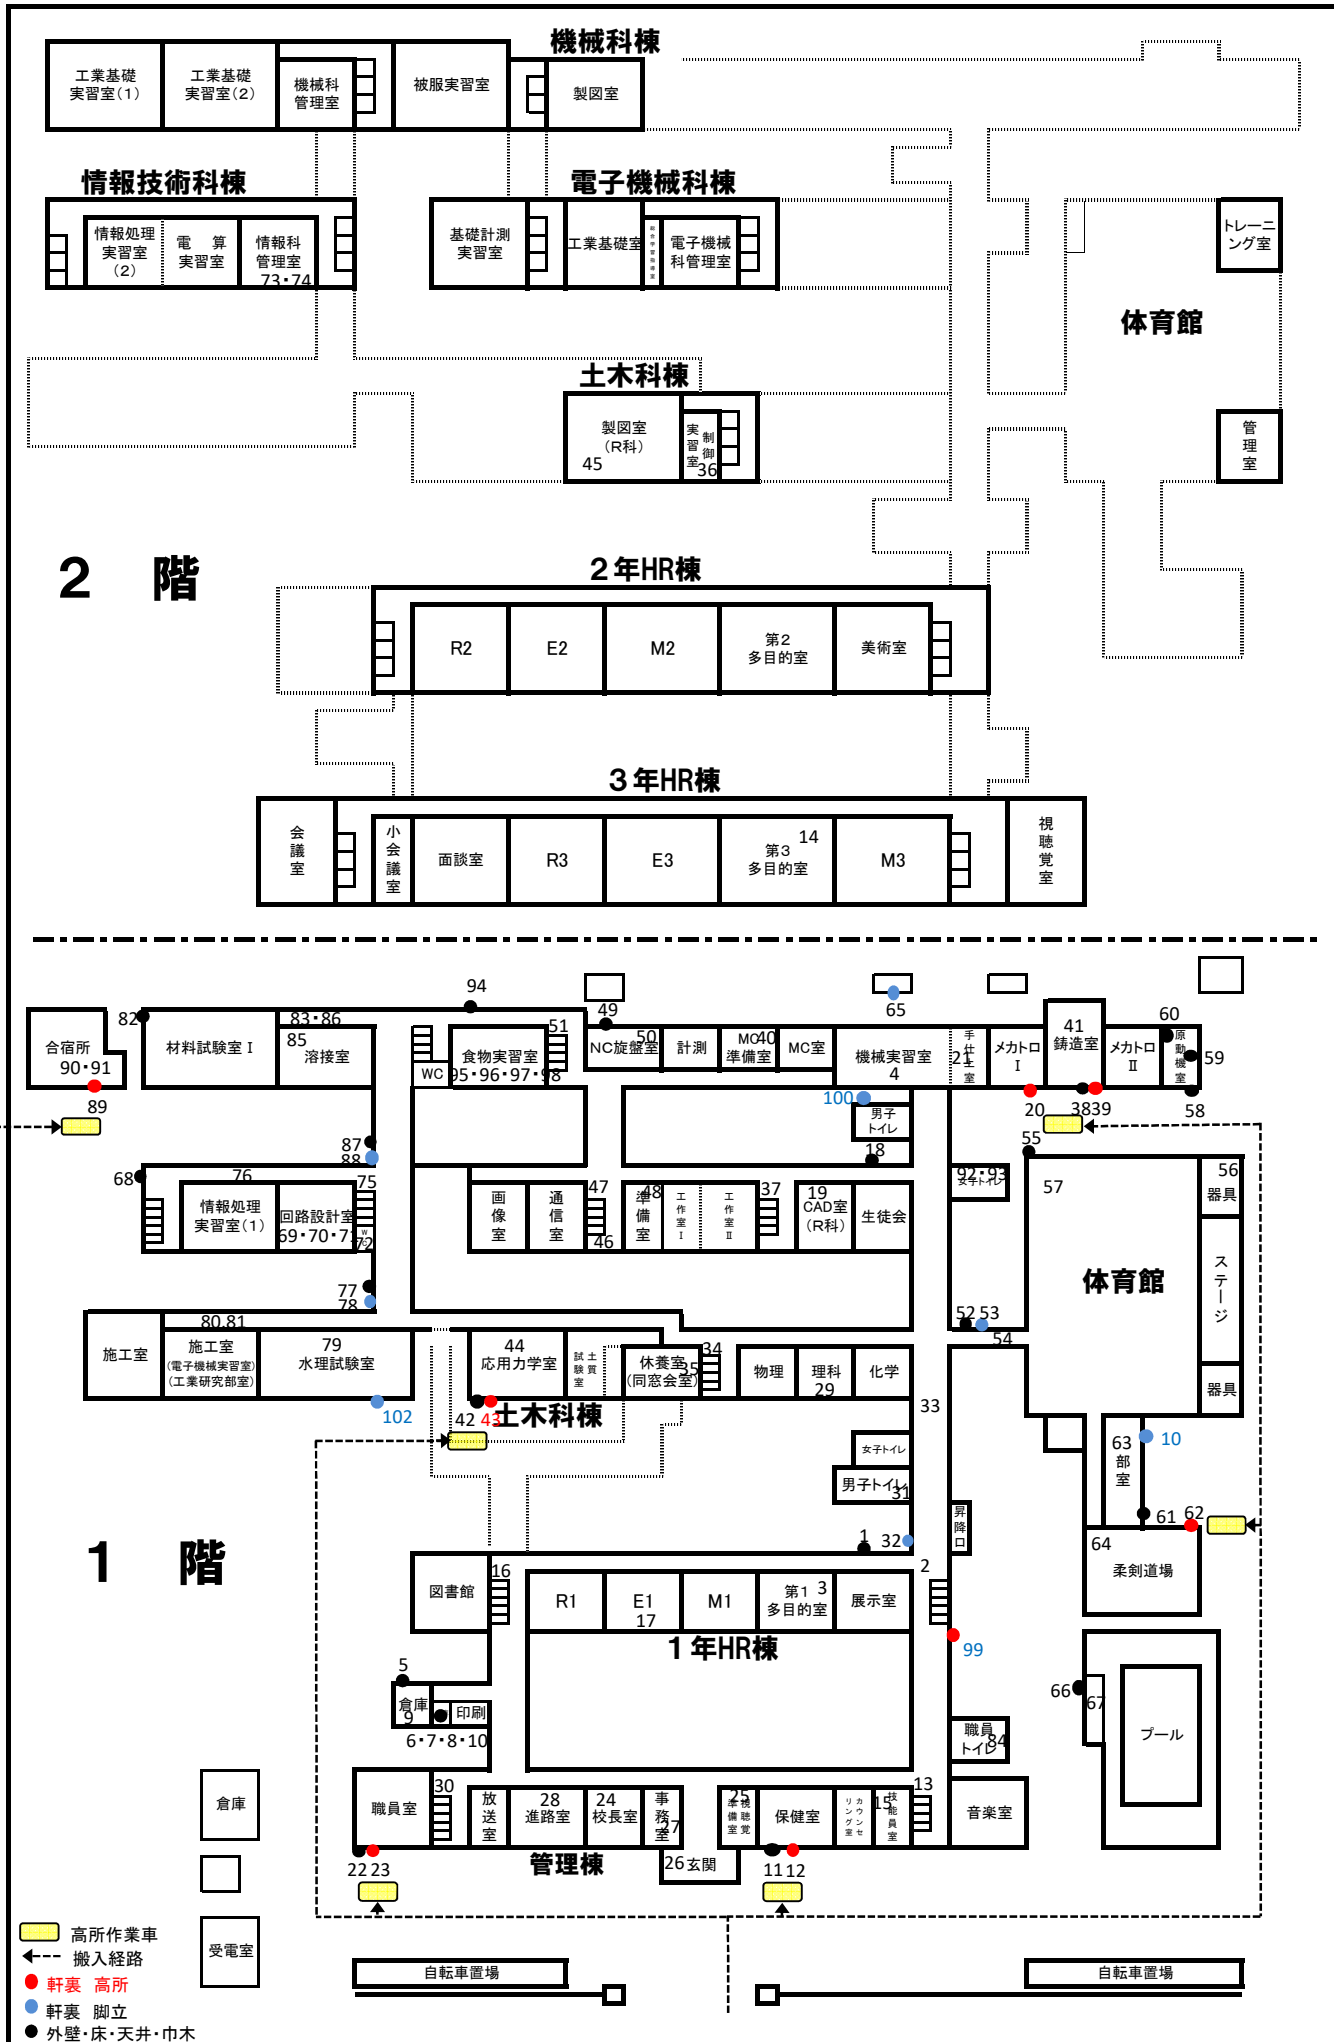

山形県立寒河江工業高等学校 石綿調査結果一覧(1/4)

試料番号	棟番号	室名	場所	建材名	採取日	石綿の含有の有無	石綿種類
001	2-2	-	外部仕上・外壁	ダイヤセム ダイヤアルテックス3000#	2019年1月9日	無	-
002	2-2	階段室	内部仕上・床	Pタイル	2018年12月26日	無	-
003	2-2	多目的室	内部仕上・天井	PB	2018年12月27日	無	-
004	5-4	機械加工実習室	内部仕上・天井	ジプトーン	2018年12月27日	無	-
005	7-1	-	外部仕上・外壁	ダイヤセム ダイヤアルテックス3000#	2019年1月9日	無	-
006	7-1	書庫	内部仕上・床	Pタイル	2018年12月26日	無	-
007	7-1	書庫	内部仕上・巾木	ソフト巾木	2018年12月26日	無	-
008	7-1	書庫	内部仕上・壁	PB	2018年12月26日	無	-
009	7-1	倉庫	内部仕上・天井	木毛セメント板	2018年12月26日	無	-
010	7-1	書庫	内部仕上・天井	ジプトーン	2018年12月26日	無	-
011	1-2	-	外部仕上・外壁	ダイヤセム ダイヤアルテックス3000#	2019年1月9日	無	-
012	1-2	-	外部仕上・軒裏	ケイカル板	2019年1月10日	無	-
013	1-2	階段室	内部仕上・床	Pタイル	2018年12月26日	有	クリソタイル
014	1-2	CR	内部仕上・天井	PB	2018年12月27日	無	-
015	1-2	売店・物置	内部仕上・天井	耐火ボード	2018年12月26日	無	-
016	2-1	階段室	内部仕上・床	アスタイル	2018年12月26日	有	クリソタイル
017	2-1	CR	内部仕上・天井	PB	2018年12月25日	無	-
018	4-4	-	外部仕上・外壁	ダイヤセム ダイヤアルテックス3000#	2019年1月11日	無	-
019	4-4	CAD実習室	内部仕上・天井	耐火ボード	2018年12月25日	無	-
020	5-5	-	外部仕上・軒裏	ボード	2019年2月26日	無	-
021	5-5	仕上組立実習室	内部仕上・天井	ジプトーン	2018年12月27日	無	-
022	1-1	1-1	外部仕上・外壁	ダイヤセム ダイヤアルテックス3000#	2019年1月9日	無	-
023	1-1	1-1	外部仕上・軒裏	ケイカル板	2019年1月10日	無	-
024	1-1	校長室	内部仕上・床	塩ビシート	2018年12月26日	有	クリソタイル
025	1-1	視聴覚準備室	内部仕上・壁	プラスター	2018年12月26日	無	-
026	1-1	玄関	内部仕上・天井	吸音テックス	2018年12月28日	無	-
027	1-1	事務室	内部仕上・天井	ジプトーン	2018年12月26日	無	-
028	1-1	進路指導室	内部仕上・床	Pタイル	2018年12月26日	無	-
029	3-4	理科準備室	内部仕上・床	長尺塩ビシート	2018年12月25日	無	-
030	1-1	廊下	内部仕上・天井	PB	2018年12月28日	無	-

山形県立寒河江工業高等学校 石綿調査結果一覧(2/4)

試料番号	棟番号	室名	場所	建材名	採取日	石綿の含有の有無	石綿種類
031	13	WC	内部仕上・床	アスタイル	2018年12月25日	無	-
032	14	-	外部仕上・軒裏	大平板	2019年2月26日	有	クリソタイル
033	15	渡り廊下	内部仕上・天井	耐火ボード [*]	2018年12月25日	無	-
034	3-3	階段室	内部仕上・床	アスタイル	2018年12月26日	有	クリソタイル
035	3-3	休憩室	内部仕上・天井	ジプトーン	2018年12月26日	無	-
036	3-3	制御実習室	内部仕上・天井	PB	2018年12月26日	無	-
037	4-3	階段室	内部仕上・床	Pタイル	2018年12月25日	有	クリソタイル
038	5-3	-	外部仕上・外壁	ダイヤセム ダイヤアルテックス3000#	2019年1月10日	無	-
039	5-3	-	外部仕上・軒裏	木毛セメント板	2019年1月10日	無	-
040	5-3	MC準備室	内部仕上・天井	ジプトーン	2018年12月27日	無	-
041	5-6	鋳造実習室	内部仕上・天井	木毛セメント板	2018年12月27日	無	-
042	3-1	-	外部仕上・外壁	ダイヤセム ダイヤアルテックス3000#	2019年1月9日	無	-
043	3-1	-	外部仕上・軒裏	木毛セメント板	2019年1月9日	無	-
044	3-1	応用力学実習室	内部仕上・天井	PB	2018年12月26日	無	-
045	3-2	製図室	内部仕上・天井	吸音テックス	2018年12月26日	無	-
046	4-1	倉庫	内部仕上・天井	木毛セメント板	2018年12月25日	無	-
047	4-1	階段室	内部仕上・床	Pタイル	2018年12月25日	有	クリソタイル
048	4-2	工作準備室	内部仕上・天井	PB	2018年12月25日	無	-
049	5-1、5-2	-	外部仕上・外壁	ダイヤセム ダイヤアルテックス3000#	2019年1月9日	無	-
050	5-1、5-2	NC旋盤実習室	内部仕上・天井	ジプトーン	2018年12月27日	無	-
051	5-1、5-2	階段室	内部仕上・床	Pタイル	2018年12月27日	有	クリソタイル
052	16	-	外部仕上・外壁	ネオエース吹付	2019年1月10日	無	-
053	16	-	外部仕上・軒裏	木毛セメント	2019年1月10日	無	-
054	16	渡り廊下	内部仕上・天井	タイガーボード [*]	2018年12月25日	無	-
055	17	-	外部仕上・外壁	クニテックス吹付	2019年2月26日	有	クリソタイル
056	17	放送室	内部仕上・壁	テックス	2019年2月26日	無	-
057	17	2階物置	内部仕上・天井	トリゾール板 エルジンカ吹付	2018年12月25日	無	-
058	5-7	-	外部仕上・外壁	ダイヤセム ダイヤアルテックス3000#	2019年1月10日	無	-
059	5-7	原動機実習室	内部仕上・天井	木毛セメント板	2018年12月27日	無	-
060	5-7	準備室	内部仕上・天井	PB	2018年12月27日	無	-

山形県立寒河江工業高等学校 石綿調査結果一覧(3/4)

試料番号	棟番号	室名	場所	建材名	採取日	石綿の含有の有無	石綿種類
061	23	-	外部仕上・外壁	ダイヤリシ吹付	2019年1月9日	無	-
062	24	-	外部仕上・軒裏	大平板	2019年1月10日	無	-
063	23	廊下	内部仕上・天井	PB	2018年12月25日	無	-
064	24	柔剣道場	内部仕上・天井	トリゾール板 WP吹付	2018年12月25日	無	-
065	25	-	外部仕上・軒裏	ボード	2019年1月9日	有	クリソタイル
066	30	-	外部仕上・外壁	ダイヤリシ吹付	2019年1月9日	無	-
067	30	機械室	内部仕上・天井	PB	2018年12月25日	無	-
068	33	-	外部仕上・外壁	アクリルシシ	2019年1月9日	無	-
069	33	回路設計実習室	内部仕上・床	OAフロア	2018年12月28日	無	-
070	33	回路設計実習室	内部仕上・巾木	ソフト巾木	2018年12月28日	有	クリソタイル
071	33	回路設計実習室	内部仕上・壁	PB	2019年2月26日	無	-
072	33	便所	内部仕上・天井	ダンコートP	2018年12月28日	無	-
073	33	情報技術科管理室	内部仕上・床	フリーアクセスフロア	2018年12月28日	有	クリソタイル
074	33	情報技術科管理室	内部仕上・壁	フレキシブルボード	2018年12月28日	有	クリソタイル
075	33	階段室	内部仕上・床	Pタイル	2018年12月28日	有	クリソタイル
076	33	廊下	内部仕上・天井	ジプトーン	2018年12月28日	無	-
077	35	-	外部仕上・外壁	アクリルシシ	2019年1月9日	無	-
078	34	-	外部仕上・軒裏	フレキシブルボード	2019年1月9日	有	クリソタイル
079	35	水理試験実験室	内部仕上・天井	木毛セメント板	2018年12月26日	無	-
080	35	廊下	内部仕上・床	Pタイル	2018年12月26日	有	クリソタイル
081	35	廊下	内部仕上・天井	ジプトーン	2018年12月26日	無	-
082	38	-	外部仕上・外壁	複層模様吹付け	2019年1月9日	有	クリソタイル
083	38	廊下	内部仕上・床	長尺塩ビシート	2018年12月27日	無	-
084	37	WC	内部仕上・天井	ジプトーン	2018年12月26日	無	-
085	38	溶接実習室	内部仕上・天井	木毛マグネシウム板	2018年12月27日	無	-
086	38	廊下	内部仕上・天井	化粧PB	2018年12月27日	無	-
087	39	-	外部仕上・外壁	吹付タイル	2019年1月9日	無	-
088	39	-	外部仕上・軒裏	フレキシブルボードEP	2019年1月9日	有	クリソタイル
089	42	-	外部仕上・軒裏	ボード	2019年1月10日	有	クリソタイル
090	42	合宿所	内部仕上・壁	ボード	2018年12月28日	有	クリソタイル

山形県立寒河江工業高等学校 石綿調査結果一覧(4/4)

試料番号	棟番号	室名	場所	建材名	採取日	石綿の含有の有無	石綿種類
091	42	合宿所	内部仕上・天井	ボード	2018年12月28日	有	クリソタイル
092	45	女子WC	内部仕上・壁	リシン吹付	2018年12月25日	無	-
093	45	女子WC	内部仕上・天井	ボード貼り	2018年12月25日	無	-
094	46	-	外部仕上・外壁	複層模様吹付け	2019年1月9日	有	クリソタイル
095	46	食物準備室	内部仕上・床	長尺塩ビシート	2019年12月27日	無	-
096	46	食物準備室	内部仕上・巾木	ソフト巾木	2019年12月27日	無	-
097	46	食物準備室	内部仕上・壁	PB	2019年12月27日	無	-
098	46	食物準備室	内部仕上・天井	吸音PB	2019年12月27日	無	-
099	2-2	-	外部仕上・軒裏	ケイカル板	2019年1月10日	無	-
100	19	-	外部仕上・軒裏	ダイヤモンド アルテックス3000#	2019年1月11日	無	-
101	23	-	外部仕上・軒裏	ダイヤモンド吹付	2019年1月10日	無	-
102	35	-	外部仕上・軒裏	アクリルリシン	2019年1月10日	無	-

山形県立寒河江工業高等学校 既存施設の外部仕上げにおけるアスベスト含有状況

棟番号	棟名称	建材名	石綿種類	面積 (㎡)
17	体育館	クニテックス吹付け	クリソタイル	36.08
38	実習室	複層模様吹付け	クリソタイル	640.59
46	家庭科実習室棟	複層模様吹付け	クリソタイル	421.52
合計				1098.19

※石綿含有調査結果より、外部仕上げに係る含有量を記載
